

Ejecución y Seguimiento de Sprints

PRESENTADO POR:

JHOAN SEBASTIAN AGUDELO RODRIGUEZ

FICHA No:3311983

PRESENTADO A:

FREDDY CAMILO ARDILA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

A.D.S.O

**ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.**

BOGOTÁ D.C 27/05/2026

Ejecución y Seguimiento de Sprints

Objetivo de la Guía	2
Actividad de Reflexión Inicial	2
Actividad de Contextualización	3
1. ¿Qué es un tablero Kanban?	4
2. ¿Qué objetivo tiene una reunión daily stand-up (Daily Scrum)?	4
3. ¿Qué muestra un gráfico de burndown (Burndown Chart)?	5
4. ¿Por qué es importante hacer seguimiento constante al sprint?	5
Apropiación del Conocimiento	7
Tablero Kanban	7
Estructura básica	7
Función del tablero	7
Herramientas Kanban	8
Daily Stand-Up (Reunión Diaria de Sincronización)	8
Las 3 Preguntas Clave	8
Beneficios del Daily	9
Burndown Chart (Gráfico de Trabajo Pendiente)	9
Funcionamiento y Elementos Clave	10
Ejemplo Conceptual de un Sprint de 10 Días	10
Interpretación y Toma de Decisiones	10
Flujo del Sprint	11
Buenas prácticas	11
Actividad de Apropiación del Conocimiento	12
Actividad 2 – Tablero Kanban y Gráfico Burndown	13
Se escogió un sistema de inventario como Bizly	13
Estado del Tablero Kanban (Corte: Fin del Día 3)	14
Actividad 3 – Simulación Daily	17
1. Identificación de la Causa Raíz	18
¿Por qué congeló el trabajo de los demás? En la arquitectura de software, el Backend actúa como el puente central. Al no controlar este fallo de compatibilidad, la base de datos tumba la conexión, lo que obliga a la API a responder con un Error 500 (Internal Server Error). Al recibir este fallo crítico inesperado, la interfaz del Frontend se rompe de forma visual (se congela el botón) y el especialista en QA queda totalmente de manos atadas, ya que no existe un canal funcional para ejecutar las pruebas automatizadas en Postman. Es un claro efecto dominó por falta de integración limpia.	19
2. Interpretación del Gráfico (Burndown Chart)	19
3. Plan de Acción de 15 Minutos	19
Transferencia del Conocimiento	20
Actividad 1 – Implementación de Kanban	20
Justificación Técnica de la Distribución	24
Actividad 2 – Simulación de Sprint	26
Actividad 3 – Proyecto Formativo	28

Cita narrativa:Según Google (2026), la metodología Scrum permite una flexibilidad y 29

Objetivo de la Guía

Comprender cómo se realiza la ejecución y seguimiento de un sprint utilizando herramientas y técnicas ágiles como tableros Kanban, reuniones diarias (daily stand-ups) y gráficos de burndown.

Actividad de Reflexión Inicial

El Control del Camino

Si va en un viaje largo en carretera con amigos, necesita mirar el tablero para saber cuánta gasolina queda, revisar el mapa y hablar con el copiloto si la vía está cerrada. En el software pasa igual: no basta con programar, el equipo debe saber en todo momento dónde está parado para no fracasar.

1. ¿Qué le da más desespero: saber qué le falta a su equipo o enterarse de que nadie hizo nada el día de la entrega?
Enterarme que nadie hizo nada, porque sabiendo que le falta, ya tengo parte del camino para mejorar en mi equipo, mientras que si sé que nadie entregó nada, el tiempo que se perdió es muy poco probable que se recupere, perdiendo todo el proyecto
2. Si un equipo trabaja a ciegas sin registrar qué tareas están listas, ¿cómo cree que afecte esto al cliente?

3. ¿Por qué cree que hablar con su equipo solo 10 minutos cada mañana evita que terminen trabajando doble? Ésto será muy importante, ya que se gestionarán las tareas de manera más eficiente, evitando duplicar el trabajo de manera innecesaria
4. ¿Por qué el cerebro entiende más rápido un tablero visual de tarjetas que un documento de texto largo?

Porque ésto ayuda a ahorrarse el trabajo agotador de organizar la información, ayudando a nuestro cerebro a conectar más fácilmente una idea con otra, es como un paso a paso


5. Si un compañero se bloquea con un problema de código, ¿cómo se entera el grupo antes de que sea tarde?

Con intervenciones que se harán de manera recurrente dentro del grupo, organizando lo que se ha hecho, lo que hace falta, y quien hará cierto trabajo

Actividad de Contextualización

Scrum utiliza diferentes herramientas para controlar el progreso y detectar problemas durante el sprint.

Desarrolle el siguiente reto: [Metodologías ágiles](#) las respuestas de las preguntas deben ser tomadas del reto.

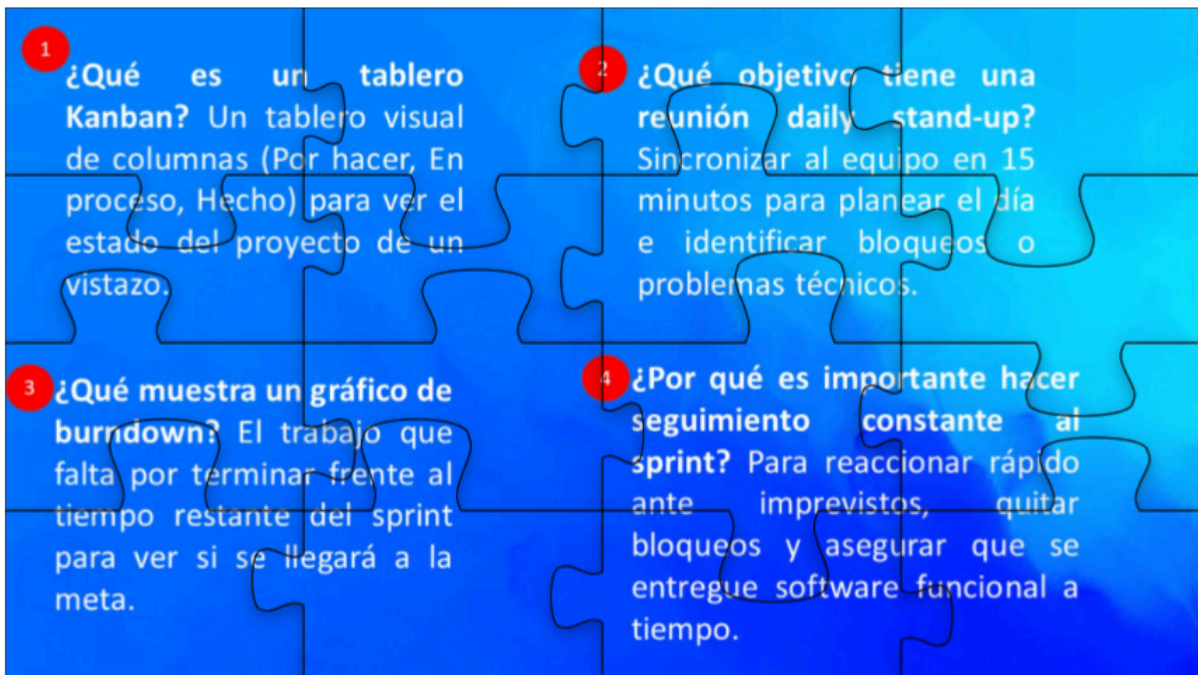

1. ¿Qué es un tablero Kanban?

Un tablero Kanban es una herramienta visual de gestión de proyectos que permite mapear y controlar el flujo de trabajo.

Estructura básica: Se divide en columnas que representan las fases del proceso de trabajo (tradicionalmente: **Por hacer**, **En progreso**, **Hecho** o *To Do*, *Doing*, *Done*).

Tarjetas: Las tareas o historias de usuario se representan mediante tarjetas visuales que se mueven de izquierda a derecha a medida que avanzan por las diferentes etapas.

Objetivo principal: Visualizar el trabajo, limitar la cantidad de tareas en curso (Work In Progress o WIP) para evitar cuellos de botella y maximizar la eficiencia del equipo.

2. ¿Qué objetivo tiene una reunión daily stand-up (Daily Scrum)?

Es una reunión diaria, corta (máximo 15 minutos) y exclusiva para el Equipo de Desarrollo, cuyo objetivo principal es sincronizar las actividades y crear un plan para las siguientes 24 horas.

Durante esta reunión, el equipo inspecciona el progreso hacia el Objetivo del Sprint (Sprint Goal) y suele responder tres preguntas clave:

- ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del Sprint?
- ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo a lograr el objetivo del Sprint?
- ¿Existe algún impedimento que me bloquee a mí o al equipo?

3. ¿Qué muestra un gráfico de burndown (Burndown Chart)?

Un gráfico de *burndown* es una representación visual que muestra **la cantidad de trabajo** que queda por hacer frente al tiempo disponible en un Sprint.

- **Eje Y (Vertical):** Muestra el esfuerzo restante (generalmente medido en horas o Puntos de Historia / *Story Points*).
- **Eje X (Horizontal):** Muestra el tiempo (los días que dura el Sprint).
- **Utilidad:** Permite ver de un solo vistazo si el equipo va a un ritmo adecuado para terminar las tareas comprometidas antes de que acabe el Sprint. Si la línea real está por encima de la línea ideal trazada, el equipo va retrasado; si está por debajo, van adelantados.

4. ¿Por qué es importante hacer seguimiento constante al sprint?

El seguimiento continuo es el núcleo del pilar de "Inspección y Adaptación" en Scrum. Es vital por varias razones:

- **Detección temprana de bloqueos:** Permite identificar rápidamente problemas técnicos o dependencias externas antes de que pongan en riesgo la entrega final.
- **Adaptabilidad:** Si el equipo nota que no podrá terminar todo lo comprometido (o que terminará antes), puede renegociar el alcance con el *Product Owner* a tiempo, manteniendo siempre el valor del producto.
- **Transparencia:** Mantiene a todo el equipo enfocado y consciente de la realidad del proyecto, evitando el "síndrome del estudiante" (dejar todo para el último día) y las sorpresas negativas durante la Sprint Review.

1. ¿Qué es un tablero Kanban?

Un tablero Kanban es una herramienta visual de gestión de proyectos que permite mapear y controlar el flujo de trabajo.

Estructura básica: Se divide en columnas que representan las fases del proceso de trabajo (tradicionalmente: **Por hacer**, **En progreso**, **Hecho** o *To Do, Doing, Done*).

Tarjetas: Las tareas o historias de usuario se representan mediante tarjetas visuales que se mueven de izquierda a derecha a medida que avanzan por las diferentes etapas.

Objetivo principal: Visualizar el trabajo, limitar la cantidad de tareas en curso (Work In Progress o WIP) para evitar cuellos de botella y maximizar la eficiencia del equipo.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es la Ejecución del Sprint?

Es la etapa donde el equipo desarrolla las tareas y funcionalidades definidas durante la planeación del sprint. Durante esta fase se: programan funcionalidades, corrigen errores, realizan pruebas y actualiza el avance del sprint.

¿Qué es el Seguimiento del Sprint?

Es el control continuo del progreso del trabajo. Permite: identificar retrasos, controlar tareas pendientes, mejorar organización y detectar bloqueos

Tablero Kanban

Es una herramienta visual que organiza tareas según su estado.

Estructura básica

Pendiente	En Proceso	Finalizado
Login	Registro usuarios	Dashboard
Reportes	Productos	Clientes

Función del tablero

Permite visualizar:

- Avance del trabajo
- Tareas pendientes
- Carga del equipo
- Estado del sprint

Herramientas Kanban

Ejemplos:

- ❖ Trello
- ❖ Jira
- ❖ GitHub Projects
- ❖ Notion

Daily Stand-Up (Reunión Diaria de Sincronización)

Es una sesión ágil, breve y dinámica que realiza el equipo de desarrollo cada mañana para alinear esfuerzos y asegurar el ritmo del proyecto.

- Duración máxima: 15 minutos (se realiza de pie para mantener la agilidad).
- Propósito clave: Coordinar el trabajo del día e identificar problemas a tiempo, no rendir cuentas a un jefe.

Las 3 Preguntas Clave


Cada integrante del equipo interviene de forma muy corta respondiendo:

1. ¿Qué logré terminar ayer? (Aporte al objetivo).
2. ¿En qué voy a trabajar hoy? (Compromiso del día).
3. ¿Tengo algún bloqueo o impedimento? (Obstáculos que frenan el avance).

Beneficios del Daily

- Mejora comunicación
- Detecta problemas rápidamente
- Organiza trabajo diario
- Facilita colaboración

Burndown Chart (Gráfico de Trabajo Pendiente)

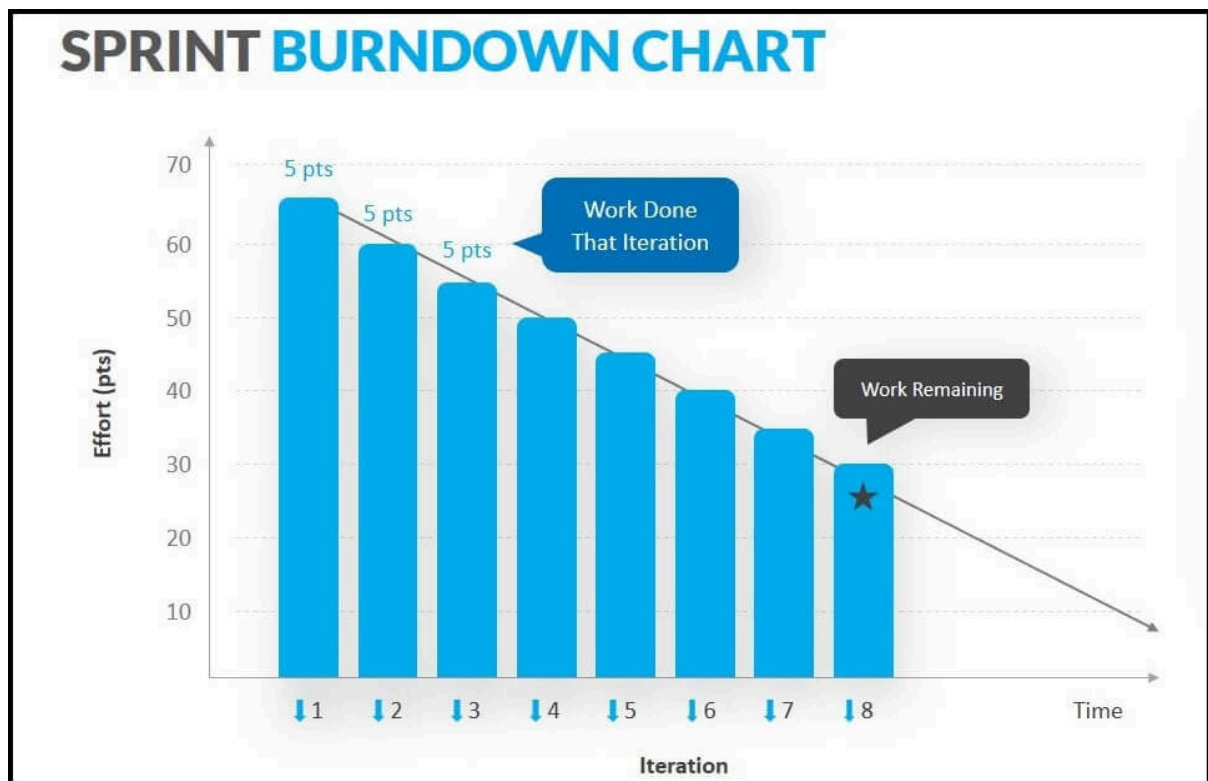

Recuperado de: <https://unichrone.com/blog/agile/sprint-burndown-chart/>

Es una herramienta visual y matemática que mide el avance del equipo en tiempo real, mostrando de forma gráfica cuánto trabajo queda por hacer frente al tiempo disponible del sprint.

Funcionamiento y Elementos Clave

El gráfico se compone de dos ejes principales y dos líneas de seguimiento:

- ★ Eje Y (Vertical): Representa el esfuerzo total estimado (puede medirse en horas o en Puntos de Historia).
- ★ Eje X (Horizontal): Representa los días de duración del sprint.
- ★ Línea Ideal: Una diagonal que va desde el total del trabajo del Día 1 hasta el cero en el último día. Muestra cómo debería avanzar el equipo matemáticamente.
- ★ Línea Real: El camino verdadero que va dejando el equipo a medida que termina y cierra tareas.

Ejemplo Conceptual de un Sprint de 10 Días

El objetivo es ver cómo la línea disminuye progresivamente hasta tocar el suelo (cero trabajo pendiente):

- Día 1: 40 puntos de trabajo estimados (Inicio del Sprint).
- Día 5: 25 puntos restantes (Progreso intermedio).
- Día 10: 0 puntos restantes (¡Sprint completado con éxito!).

Interpretación y Toma de Decisiones

La forma en que se mueve la línea real frente a la ideal le dice al equipo cómo actuar:

- Línea Real por debajo de la Ideal: El equipo va más rápido de lo planeado. Pueden terminar antes o negociar añadir más tareas.
- Línea Real por encima de la Ideal: El equipo va retrasado. Significa que hay tareas mal estimadas o bloqueos técnicos que hay que resolver de inmediato en el Daily.
- Línea Real Plana (Horizontal): Alerta crítica. Pasan los días y no se está cerrando ninguna tarea; el sprint está estancado.

Flujo del Sprint



Importancia del seguimiento

- Control del progreso
- Identificación de problemas
- Mejor organización
- Cumplimiento de objetivos
- Mejora continua

Buenas prácticas

- Actualizar tareas diariamente
- Mantener reuniones cortas
- Usar herramientas visuales

- Dividir tareas grandes
- Registrar bloqueos rápidamente


Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Mapa conceptual

Desarrolle un mapa conceptual que contenga estos términos, si no tiene clara la estructura consulte esta [imagen](#):

- Sprint
- Kanban
- Daily Stand-Up
- Burndown Chart
- Seguimiento

SEGUIMIENTO (CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO)

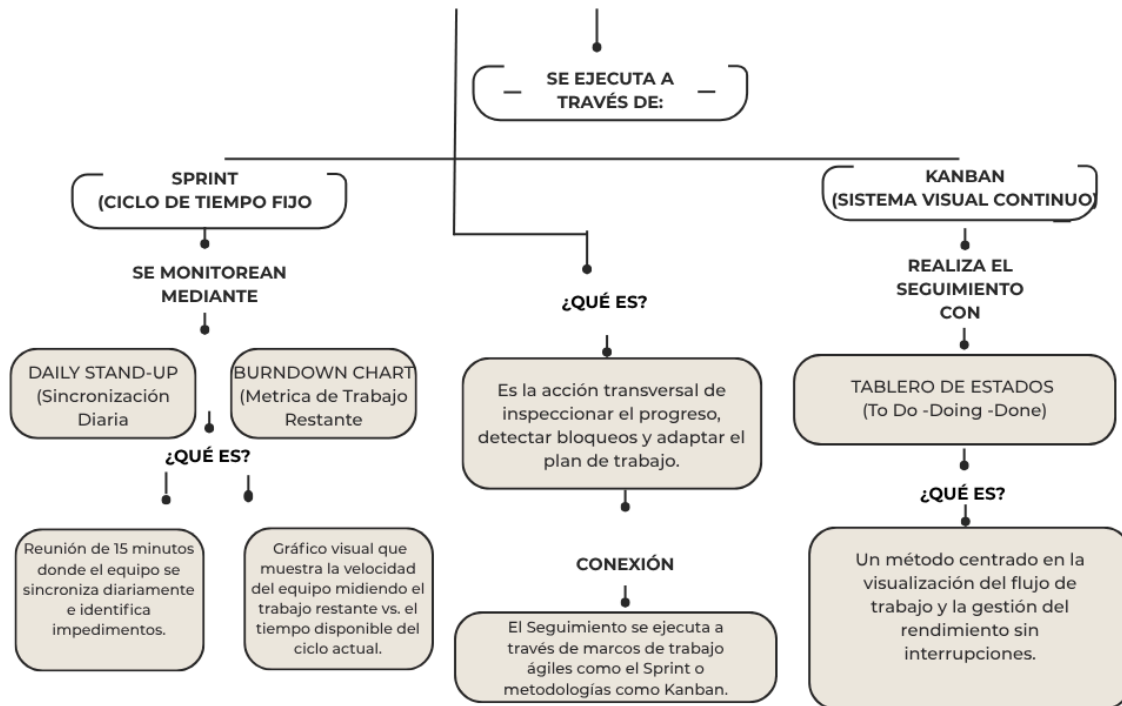

Actividad 2 – Tablero Kanban y Gráfico Burndown

Se escogió un sistema de inventario como Bizly

Estado del Tablero Kanban (Corte: Fin del Día 3)


Pendiente (To Do)	En Proceso (Doing)	Finalizado (Done)

* T10: Configurar respaldo automático de la base de datos (Backup).	* T8: Desarrollo de reportes de inventario en formato PDF. * T9: Implementar actualización masiva de precios por lote.	* T1: Login y control de accesos de usuarios. * T2: Creación de la estructura de la Base de Datos. * T3: Crear nuevo producto en el catálogo. * T4: Visualización del stock en tiempo real. * T5: Modificación de información de productos. * T6: Módulo de filtrado y búsqueda avanzada. * T7: Configuración de alertas de stock bajo.
--	--	--

Paso 2: Tabla de Datos de Esfuerzo (Seguimiento Diario)

Tiempo	Tareas Terminadas en el Día	Puntos de Esfuerzo Restantes (Línea Real)	Puntos Planificados Ideales (Línea Ideal)
Inicio (Día 0)	—	10	10
Día 1	2	8	8
Día 2	1	7	6
Día 3	4	3	4
Día 4	0 (Bloqueo técnico)	3	2
Día 5	3	0	0

Paso 3: Desarrollo del Burndown Chart

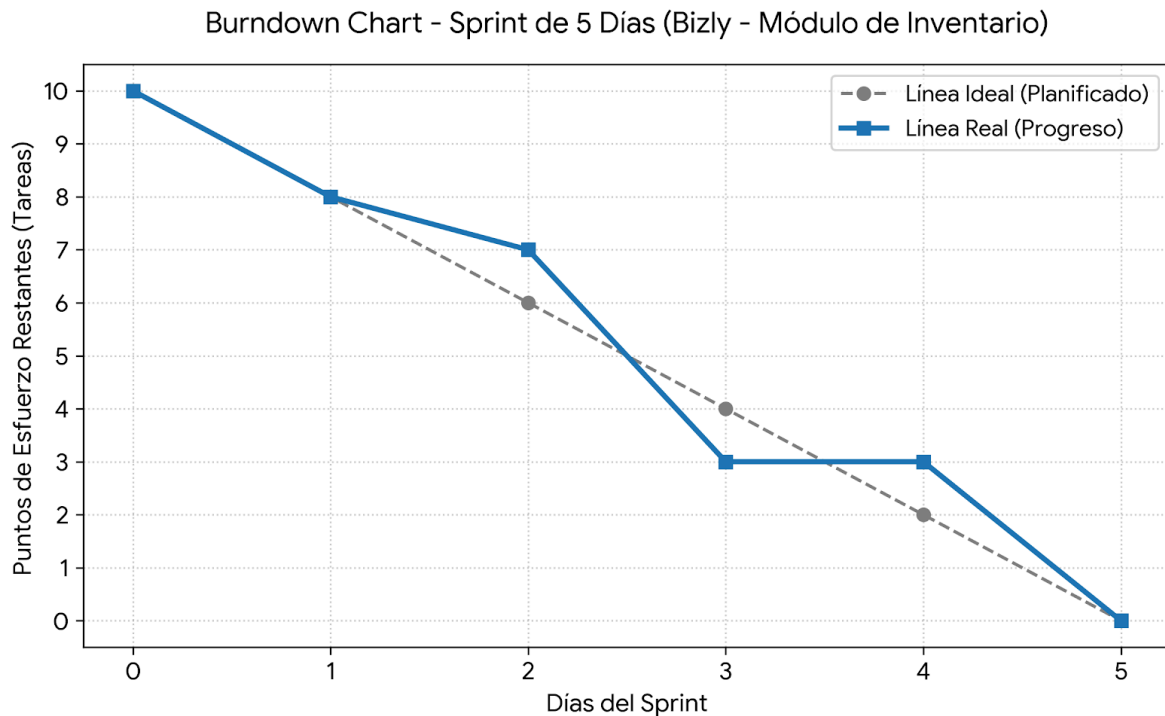

a línea punteada gris representa el rendimiento ideal esperado, mientras que la línea azul muestra el progreso real del equipo de desarrollo

Actividad 3 – Simulación Daily

Está contratado como el Líder Técnico de la empresa "Hotelia S.A.". Faltan solo 3 días para terminar el sprint y entregar el módulo de "Reservas en Línea". Al llegar a la oficina, revisa el tablero Kanban (estancado), el Burndown Chart (línea totalmente plana) y escuchas las intervenciones de tus desarrolladores en el Daily Stand-Up:

- Desarrollador Frontend (Interfaz): "Ayer dejé listo el formulario visual de reservas. Hoy planeaba conectarlo, pero tengo un bloqueo: al presionar el botón 'Confirmar Reserva' la página se congela y arroja un Error 500 en la consola".

- Desarrollador Backend (API/Lógica): "Ayer programé el endpoint POST /api/v1/reservas. Hoy iba a probar la lógica de negocio, pero la base de datos me rechaza las peticiones porque me arroja un error de formato en el campo de fecha".
- Administrador de Base de Datos (DBA): "Ayer creé la tabla reservas. Hoy detecté que el Backend me está enviando la fecha con hora incluida (ISO String), pero la base de datos tiene una restricción que solo acepta datos limpios en formato YYYY-MM-DD. Por eso el sistema tumba la conexión".
- Especialista en QA (Pruebas): "Ayer diseñé los casos de prueba en Postman. Hoy no puedo ejecutar nada ni validar el software porque todo el flujo saca error por el problema de la fecha".

Como analista de ADSO, debe presentar un documento corto resolviendo los siguientes puntos con tus propias palabras:

- Identificación de la Causa Raíz: ¿Cuál de los 4 roles tiene la llave para destrabar el problema de raíz y por qué el error de ese rol terminó congelando el trabajo de los demás?

1. Identificación de la Causa Raíz

La llave para destrabar el problema de raíz la tiene el **Desarrollador Backend**, en estricta coordinación con el **DBA**. El error se origina porque la API no está sanitizando ni formateando los datos de entrada antes de enviarlos a la capa de persistencia; está intentando registrar una cadena con zona horaria (ISO String) en un campo de la base de datos que tiene una restricción estricta de fecha limpia (YYYY-MM-DD).

¿Por qué congeló el trabajo de los demás? En la arquitectura de software, el Backend actúa como el puente central. Al no controlar este fallo de compatibilidad, la base de datos tumba la conexión, lo que obliga a la API a responder con un Error 500 (Internal Server Error). Al recibir este fallo crítico inesperado, la interfaz del Frontend se rompe de forma visual (se congela el botón) y el especialista en QA queda totalmente de manos atadas, ya que no existe un canal funcional para ejecutar las pruebas automatizadas en Postman. Es un claro efecto dominó por falta de integración limpia.

- Interpretación del Gráfico: Explicación lógica de por qué la línea del Burndown Chart se quedó plana durante estos días de error.

2. Interpretación del Gráfico (Burndown Chart)

La línea del Burndown Chart se quedó completamente plana (horizontal) porque representa el **esfuerzo o tareas restantes**. En los marcos ágiles como Scrum, una tarea solo se "quema" (se resta del gráfico) cuando está **100% Finalizada (Done)** bajo los criterios de aceptación y calidad.

Como el bloque de código no ha podido integrarse ni probarse debido al Error 500, el avance real del equipo es de **cero tareas entregadas** durante estos días. El gráfico no mide "horas sentados trabajando", sino valor real entregado; al no haber despliegues exitosos, la gráfica muestra un estancamiento total del progreso.

- Plan de Acción de 15 Minutos: Escribe un mensaje directo de máximo 4 renglones dirigido a tu equipo de desarrollo, indicándoles detalladamente qué deben hacer el Backend y el DBA en las próximas dos horas para que el Frontend y QA puedan continuar con su trabajo.

3. Plan de Acción de 15 Minutos

Equipo Hotelia: Prioridad absoluta para las próximas 2 horas. **[Backend]**, aplica inmediatamente un formateador o truncado (`.split('T')[0]`) en el controlador de la API para transformar el ISO String recibido a formato `YYYY-MM-DD` antes de ejecutar el INSERT. **[DBA]**, apóyalo monitoreando los logs de la base de datos para confirmar que la restricción deje pasar la petición. En cuanto el endpoint responda un `201 Created`, avisen al grupo para que **[Frontend]** acople la vista y **[QA]** ejecute sus pruebas en Postman. ¡A por ese cierre!

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Implementación de Kanban

Ha sido contratado de urgencia como el nuevo desarrollador y organizador del proyecto "MediCitas", un sistema web para la gestión de citas de una clínica privada. El desarrollador anterior renunció sorpresivamente a mitad del proyecto y dejó un desorden absoluto. Quedan solo 5 días para la entrega final al cliente (Director de la Clínica) y las tareas están completamente mezcladas en un bloque de notas sin ningún orden ni estado de avance.

Su misión es analizar la lista técnica de pendientes, clasificarlos según su prioridad e impacto, y estructurar el flujo de trabajo en un tablero Kanban para garantizar la entrega a tiempo.

Paso 1: Lista de Tareas Encontradas (El Desorden Técnico)

Analice detalladamente las siguientes 10 actividades heredadas:

1. Diseñar el formulario web de registro para nuevos pacientes.
2. Programar el endpoint POST /api/v1/citas para guardar las citas en la base de datos.
3. El botón de "Cancelar Cita" genera un Error 500 en el servidor y tumba el sistema.
4. Crear la base de datos relacional y las tablas pacientes, medicos y citas.
5. Diseñar la interfaz visual (UI) para la vista del panel del médico.
6. Cambiar el color del logotipo en el pie de página por petición estética del cliente.
7. Conectar el formulario del Frontend con la API del Backend para agendar la cita.
8. Configurar las pruebas automatizadas en Postman para validar el flujo de inicio de sesión.
9. Corregir una restricción en la base de datos que duplica las citas a la misma hora con el mismo médico.
10. Escribir el manual de usuario técnico sobre cómo operar el sistema.

Paso 2: Construcción y Clasificación en el Tablero Kanban

Cree un tablero Kanban con las columnas obligatorias: Por Hacer (To Do), En Proceso (In Progress) y Hecho (Done).

Por Hacer (To Do) (Ordenado por prioridad de arriba a abajo)	En Proceso (In Progress) (Máximo 3 tareas críticas / bloqueos)	Hecho (Done) (Infraestructura y diseño base terminado)
--	--	--

1. Alta Prioridad (Funcionalidad Core): * T2: Programar el endpoint <code>POST /api/v1/citas</code> para guardar las citas en la base de datos. * T7: Conectar el formulario del Frontend con la API del Backend para agendar la cita. 2. Media Prioridad (Estabilidad/QA): * T8: Configurar las pruebas automatizadas en Postman para validar el flujo de inicio de sesión. 3. Baja Prioridad (Documentación y Estética):	* T3: [CRÍTICO] El botón de "Cancelar Cita" genera un Error 500 en el servidor y tumba el sistema. *T9: [BLOQUEO] Corregir una restricción en la base de datos que duplica las citas a la misma hora con el mismo médico.	* T4: Crear la base de datos relacional y las tablas <code>pacientes</code>, <code>medicos</code> y <code>citas</code>. * T1: Diseñar el formulario web de registro para nuevos pacientes. * T5: Diseñar la interfaz visual (UI) para la vista del panel del médico.
---	---	---

* T10: Escribir el manual de usuario técnico sobre cómo operar el sistema. * T6: Cambiar el color del logotipo en el pie de página por petición estética del cliente.		
---	--	--

Como analista, debe distribuir las 10 tareas basándose en la lógica del estado actual del caso:

- Hecho: Coloque aquí únicamente las tareas de infraestructura o diseño base que lógicamente debieron quedar listas al principio para poder avanzar con el resto del código.
- En Proceso: Coloque un máximo de 3 tareas críticas que presenten bloqueos urgentes o errores en el servidor que se deban solucionar de inmediato hoy mismo.
- Por Hacer: Coloque las tareas restantes organizadas de arriba a abajo por orden de prioridad (las funciones vitales para el cliente arriba, los detalles estéticos o de documentación abajo).

Justificación Técnica de la Distribución

1. Por qué las tareas están en "Hecho" (Done):

- En la arquitectura de software, no se pueden construir rutas (endpoints) ni conectar pantallas sin que exista primero la base de datos (T4).

- De igual manera, las tareas de maquetación y diseño visual de interfaces (**T1** y **T5**) tuvieron que ser finalizadas por el desarrollador anterior, ya que sirven como el molde visual antes de poder programar la lógica de negocio detrás de ellas.

2. Por qué las tareas están en "En Proceso" (In Progress):

- Estas dos tareas (**T3** y **T9**) representan los mayores riesgos para el proyecto a 5 días de la entrega. El **Error 500** corrompe la estabilidad completa del servidor, y la falta de restricción de unicidad en las citas destruye la integridad de los datos de la clínica (permitiendo colisiones de horarios). Deben ser atacadas de inmediato hoy mismo para estabilizar el sistema.

3. Lógica de ordenamiento en "Por Hacer" (To Do):

- **Primero (Esencial):** Programar el endpoint de la API (**T2**) e integrarlo con el formulario (**T7**) es el núcleo (*Core*) de MediCitas; sin agendar citas, el software no tiene valor comercial.
- **Segundo (Validación):** Las pruebas en Postman (**T8**) aseguran que los usuarios puedan loguearse de forma segura antes del despliegue.
- **Tercero (Cierre):** El manual técnico (**T10**) y el cambio cosmético del logo (**T6**) se dejan al final de la cola porque, aunque el cliente los solicitó, no impiden el funcionamiento operativo del Producto Mínimo Viable (MVP).

Actividad 2 – Simulación de Sprint

¡El tablero Kanban que organizó individualmente en la Actividad 1 ha sido aprobado! Ahora, asumirá el control del código de "MediCitas". Tienen exactamente 5 días simulados para mover las tareas pendientes a la columna de "Hecho" y solucionar los errores del servidor antes de la entrega final.

Paso 1: Ejecución y Actualización del Tablero: Durante la simulación de la semana, deben interactuar directamente con su tablero Kanban (físico o digital): Cada vez que inicien el día, deben elegir qué tarjetas mover a "En Desarrollo". Ningún desarrollador puede tener más de 2 tarjetas en proceso al mismo tiempo (Límite WIP) para evitar la acumulación de trabajo. Al final de cada día, deben registrar los avances reales en la siguiente bitácora de seguimiento.

Paso 2: Bitácora Obligatoria de Seguimiento del Sprint: Copien y diligencien la siguiente tabla en equipo, detallando con lenguaje técnico preciso lo que ocurre en su proyecto:

Día	Actividades Realizadas (¿Qué se avanzó o cerró?)	Bloqueos Detectados (Errores técnicos o dudas)
Día 1	(Cierre de 2 tareas): Arranque óptimo del sprint. Se finalizaron y pasaron a "Hecho" las dos primeras	Ninguno. El entorno de desarrollo y los repositorios funcionaron

	tareas base, correspondientes al diseño del Dashboard y la creación del catálogo de Clientes.	correctamente sin interrupciones.
Día 2	(Cierre de 1 tarea): Avance moderado. Solo se logró pasar a "Hecho" una tarea (Registro de usuarios). El resto del equipo continuó programando en la columna "En Proceso".	Dudas de lógica: Fricciones menores con la validación de los formularios y la estructura de la base de datos, lo que generó un ritmo más lento del esperado.
Día 3	(Cierre de 4 tareas): Alta productividad. Se terminaron y cerraron 4 tareas de golpe (Módulos de Login, Roles y Reportes). El equipo logró adelantar gran parte del trabajo pendiente.	Ninguno. Se resolvieron las dudas del día anterior y la integración del código fluyó sin problemas de compatibilidad.

Día 4	(Cierre de 0 tareas): El tablero quedó congelado. No se logró pasar ninguna tarea a "Hecho" a pesar del esfuerzo del equipo de desarrollo.	Fallo Crítico: Se detectó un error severo en las peticiones de la API (Error 500) que tumbó el servidor local y bloqueó el trabajo de pruebas (QA) y conexión con el Frontend.
Día 5	(Cierre de 3 tareas): Cierre exitoso del Sprint. Se finalizaron las últimas 3 tareas (CRUD de productos) y se entregó el incremento de software al 100%.	Solución del bloqueo: El equipo se organizó (programación en parejas) para corregir el fallo del servidor a primera hora, destrabando el flujo y terminando a tiempo.

Actividad 3 – Proyecto Formativo

Desarrolle por medio del siguiente formato, los daily de su equipo de trabajo, con las siguientes condiciones:

- Se debe desarrollar durante 5 días diferentes
- Cada día el ScrumMaster deberá ser un aprendiz diferente
- Se debe desarrollar con el siguiente formato (si desea puede añadir una nueva hoja por cada reunión) [Formato](#)}

Cita narrativa:Según Google (2026), la metodología Scrum permite una flexibilidad y adaptación constante a las necesidades del mercado...

Cita parentética estimación por puntos de historia permite al equipo medir el esfuerzo relativo basándose en la complejidad y la incertidumbre (Google, 2026).
